


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÀ NẴNG

DỰ ÁN XÂY DỰNG
NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC NGÃ BA HUẾ
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
18-12-2013



TIẾN ĐỘ THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI ĐẾN 18-12-2013

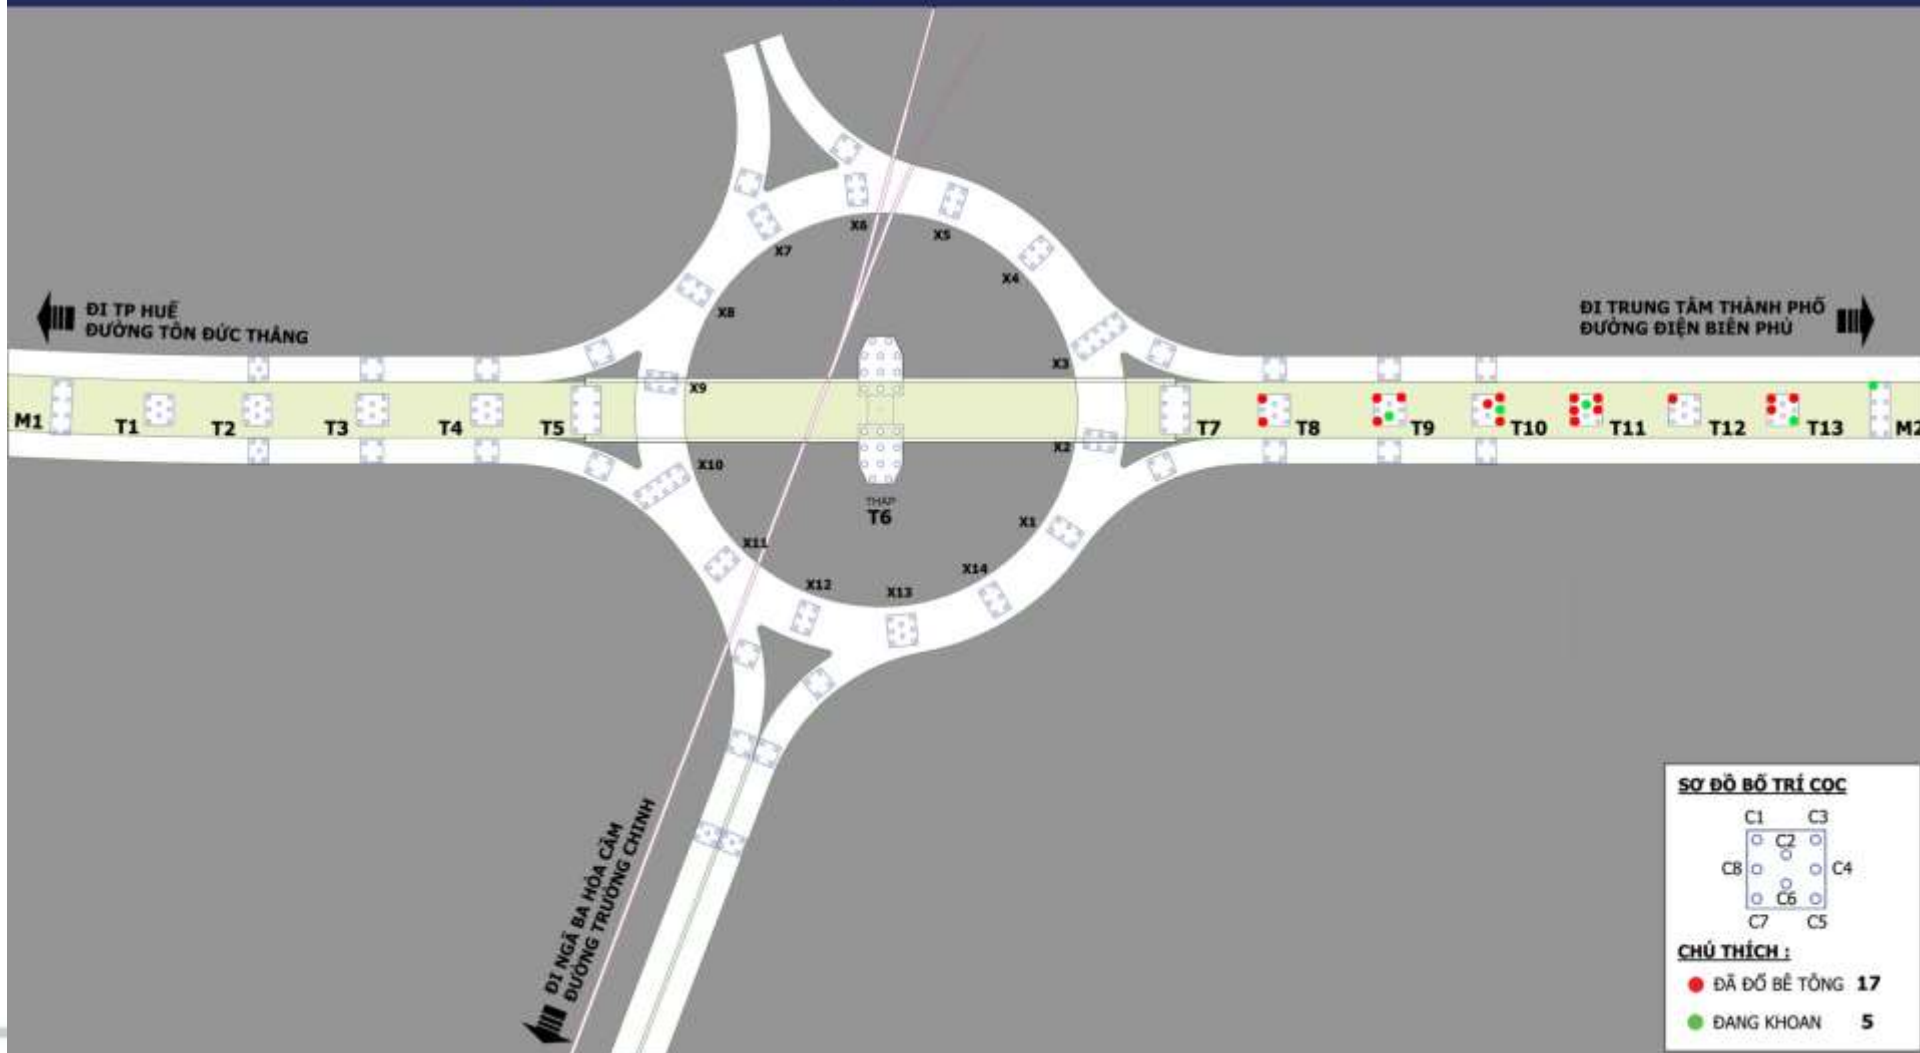

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CỌC




CHÚ THÍCH :

- ĐÃ ĐỔ BÊ TÔNG 17
- ĐANG KHOAN 5

KẾ HOẠCH THI CÔNG DỰ KIẾN

CHÚ THÍCH :

- DỰ KIẾN TRIỂN KHAI
- ĐÃ HOÀN THÀNH

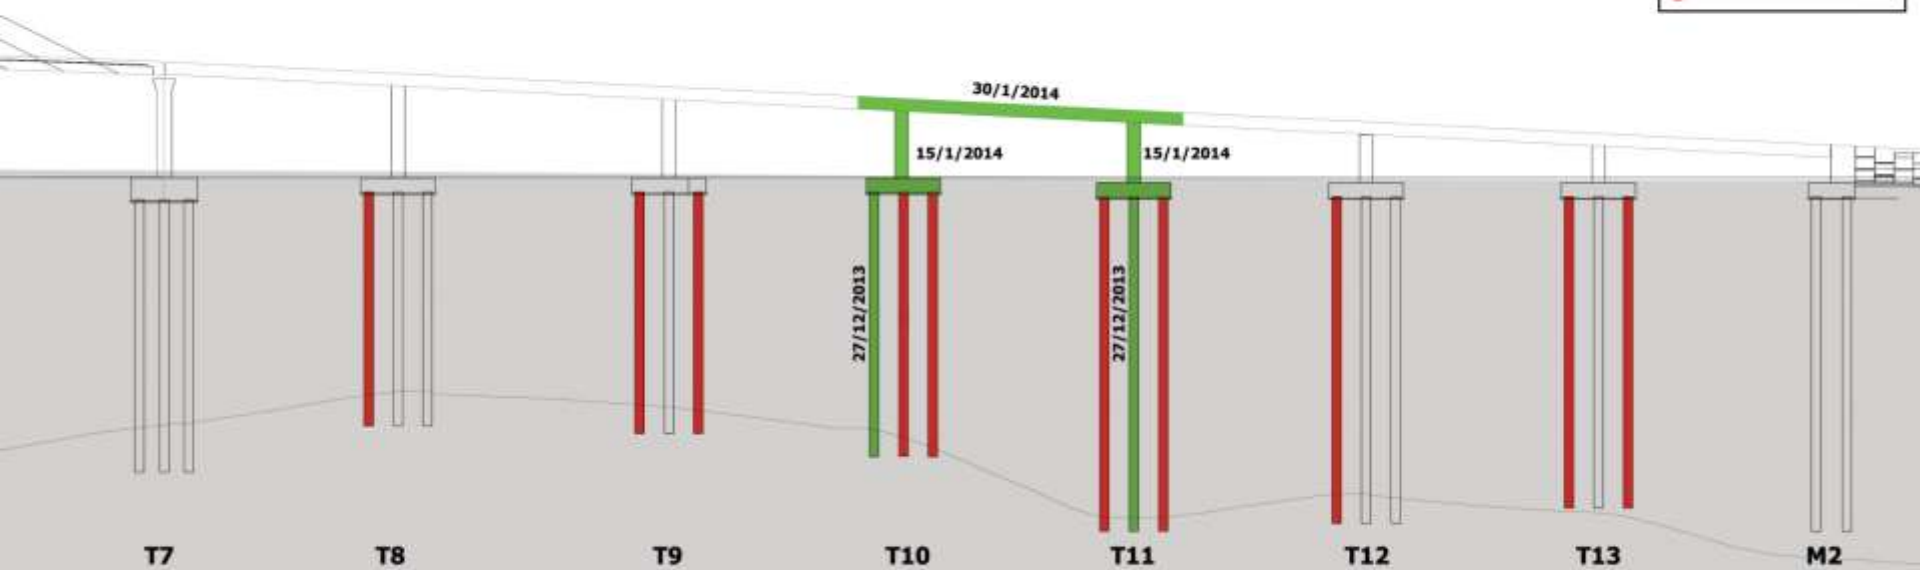

MẶT BẰNG CÔNG TRƯỜNG ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ



HÌNH ẢNH THI CÔNG



CÔNG TÁC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG



BÊ TÔNG VỈA HÈ ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG



SỬA CHỮA TẠM MẶT ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG



LẮP ĐẶT HÀNG RÀO ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG



KIẾN NGHỊ VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Hiện nay, công tác thi công đã được triển khai trên công trường. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa mua bảo hiểm được vì hợp đồng BT chính thức chưa được ký kết. Nếu có các vấn đề rủi ro xảy ra sẽ rất khó giải quyết. Kiến nghị UBND tiến hành ký kết hợp đồng.
2. Cam kết đảm bảo lãnh thanh toán 200 tỷ đồng để SHB giải ngân đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có, kiến nghị UBND phát hành cam kết cho SHB.
3. Dự án đăng ký thi công kể cả Tết Dương lịch và Tết Âm lịch. Kính đề nghị UBND chỉ đạo các Ban, Ngành phối hợp thực hiện.
4. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ Nhà đầu tư trong công tác di dời công trình ngầm và nổi, giải phóng mặt bằng.
5. Kiến nghị UBND có các biện pháp giải quyết các hộ dân cản trở không cho thi công. Hiện nay nhân dân phường Hòa An vẫn không cho Nhà thầu thi công.
6. Tiếp tục chỉ đạo Ban giải tỏa đề bù số 3 quyết liệt trong công tác đền bù, kịp giải phóng mặt bằng.



Trân trọng cảm ơn
